




Załącznik do uchwały Nr 49/2108/20  
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
z dnia 9 grudnia 2020 r.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU DZIAŁAŃ NA 2020 ROK  
DLA RPO WK-P NA LATA 2014-2020  
za III kwartał 2020 r.**

**KONTRAKTACJA brutto** (nie uwzględnia umów rozwiązanych w danym okresie, uwzględnia aneksy zwiększające dofinansowanie)

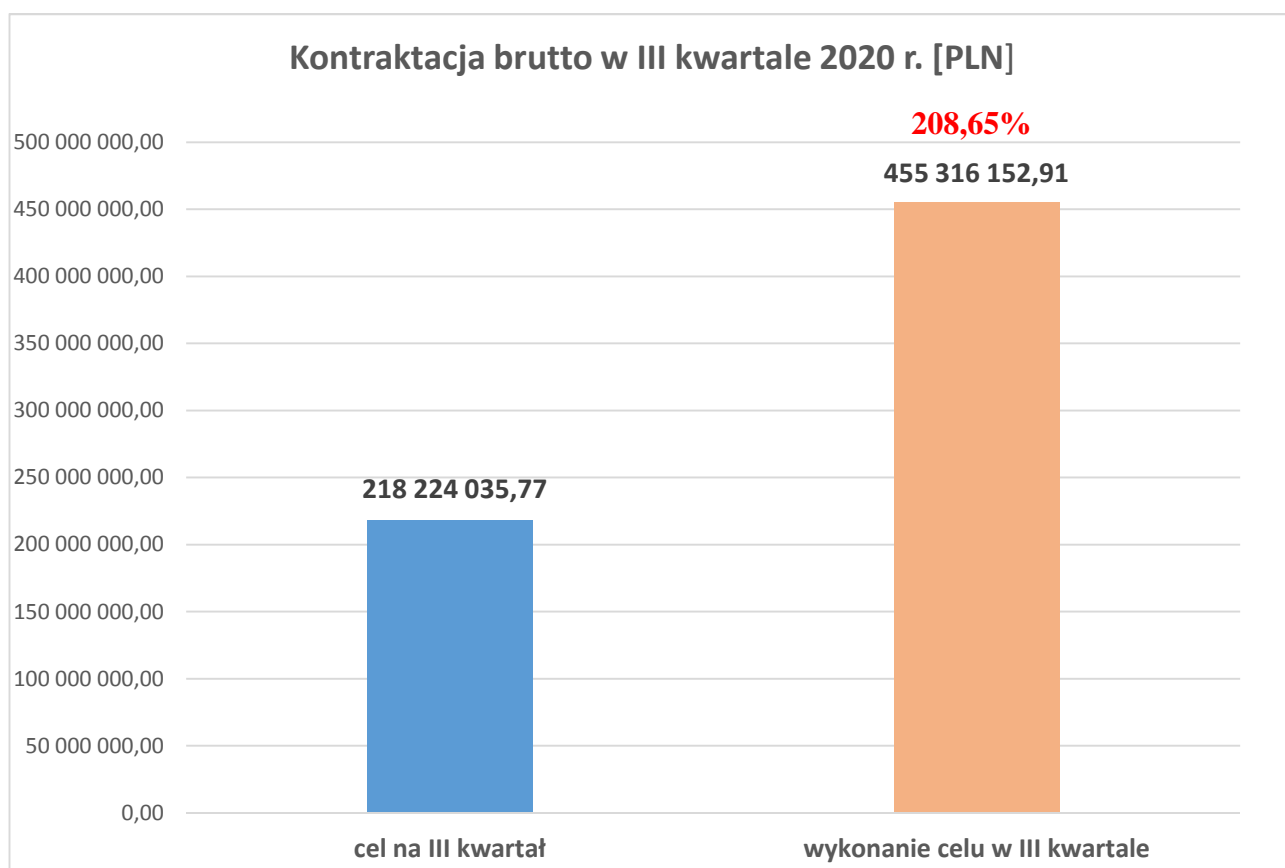


Plan działań na 2020 rok zakłada, że przyrost kontraktacji w III kwartale 2020 r. wyniesie 2,70% alokacji Programu<sup>1</sup>, co przełoży się na osiągnięcie na koniec III kwartału kontraktacji na poziomie 85,09%.

<sup>1</sup> Na potrzeby Sprawozdania z realizacji Planu Działań na 2020 r. dla RPO WK-P na lata 2014-2020 za III kwartał 2020 r. dla obliczenia kontraktacji brutto przyjęto wartość alokacji Programu przeliczoną po kursie 4,2567, tj. 8 102 799 939,67 zł.

Biorąc pod uwagę działania podjęte w III kwartale (nie uwzględniając umów rozwiązanych, a uwzględniając aneksy zwiększające dofinansowanie w tym okresie) należy uznać, że cel kontraktacji (brutto) dla Programu na III kwartał 2020 r. zrealizowany został w 208,65%.

Wartość umów podpisanych w ramach EFRR stanowiła kwotę 418 032 991,50 zł, co przełożyło się na realizację zaplanowanego celu w 380,32%, natomiast wartość umów podpisanych w ramach EFS stanowiła kwotę 37 283 161,41 zł, co przełożyło się na realizację zaplanowanego celu w 34,42%. Wartość umów podpisanych w III kwartale (łącznie 455 316 152,91 zł) stanowi 5,62% alokacji przyznanej na realizację Programu, zatem planowany przyrost kontraktacji na poziomie 2,7% został zrealizowany.

**KONTRAKTACJA netto** (uwzględnia wszystkie zmiany związane z aneksowaniem i rozwiązywaniem umów)

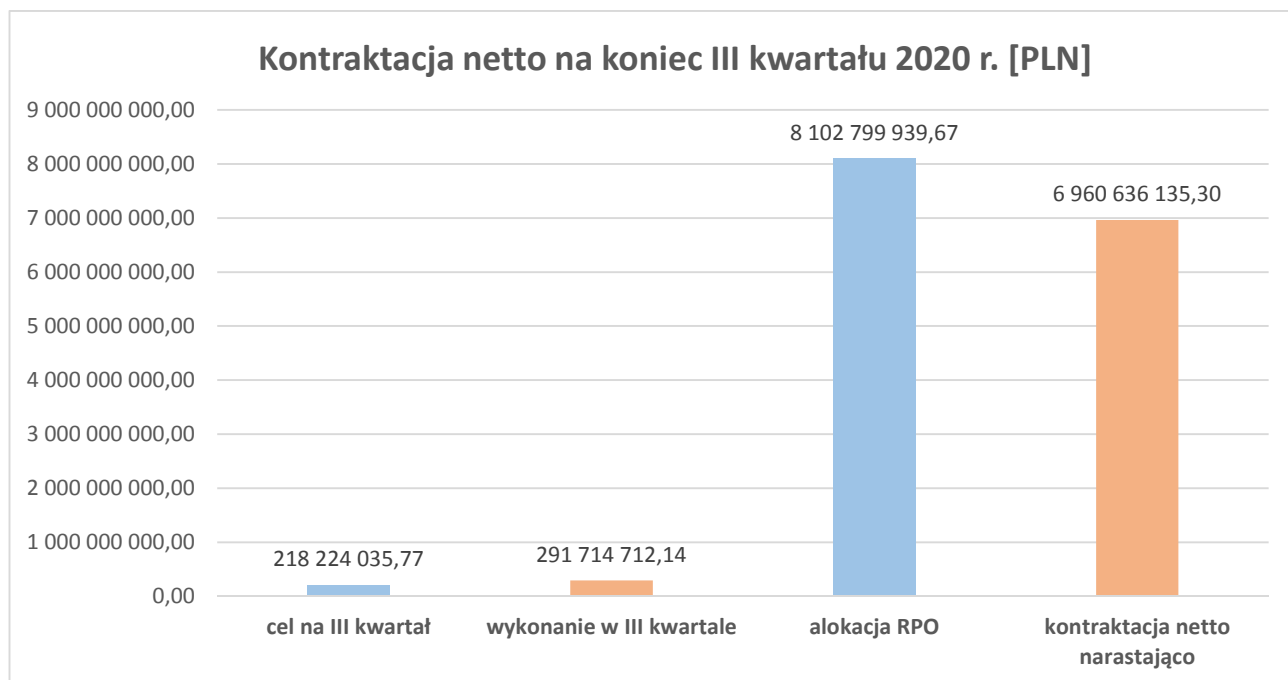


W Planie działań na 2020 rok przyjęto za cel kontraktacji osiągnięcie 89% alokacji Programu na koniec IV kwartału.

W 2020 r. odstąpiono od podpisania 13 umów na wartość środków UE 12 682 927,02 zł oraz anulowano/rozwiązano 36 umów na wartość środków UE 251 479 933,77 zł. W związku z aneksowaniem umów, uwzględniając zarówno aneksy zwiększające, jak i zmniejszające wartość umów podpisanych w ramach EFRR zmniejszyła się o -30 440 719,22 zł, natomiast wartość umów

podpisanych w ramach EFS zwiększyła się o 14 202 491,78 zł. Ostatecznie, kontraktacja netto w III kwartale wyniosła 291 714 712,14 zł.

Biorąc pod uwagę fakt, że kontraktacja jest procesem zmieniającym się w czasie zarówno poprzez podpisywanie nowych umów o dofinansowanie projektu, ale także poprzez aneksowanie już zawartych umów (uwzględniające oszczędności powstałe na projektach lub uwzględniające podwyższenie poziomu dofinansowania), jak również ich rozwiązywanie, kontraktacja netto (narastająco) na koniec III kwartału 2020 r. wyniosła 6 960 636 135,30 zł, co stanowi 85,90% alokacji.

## CERTYFIKACJA

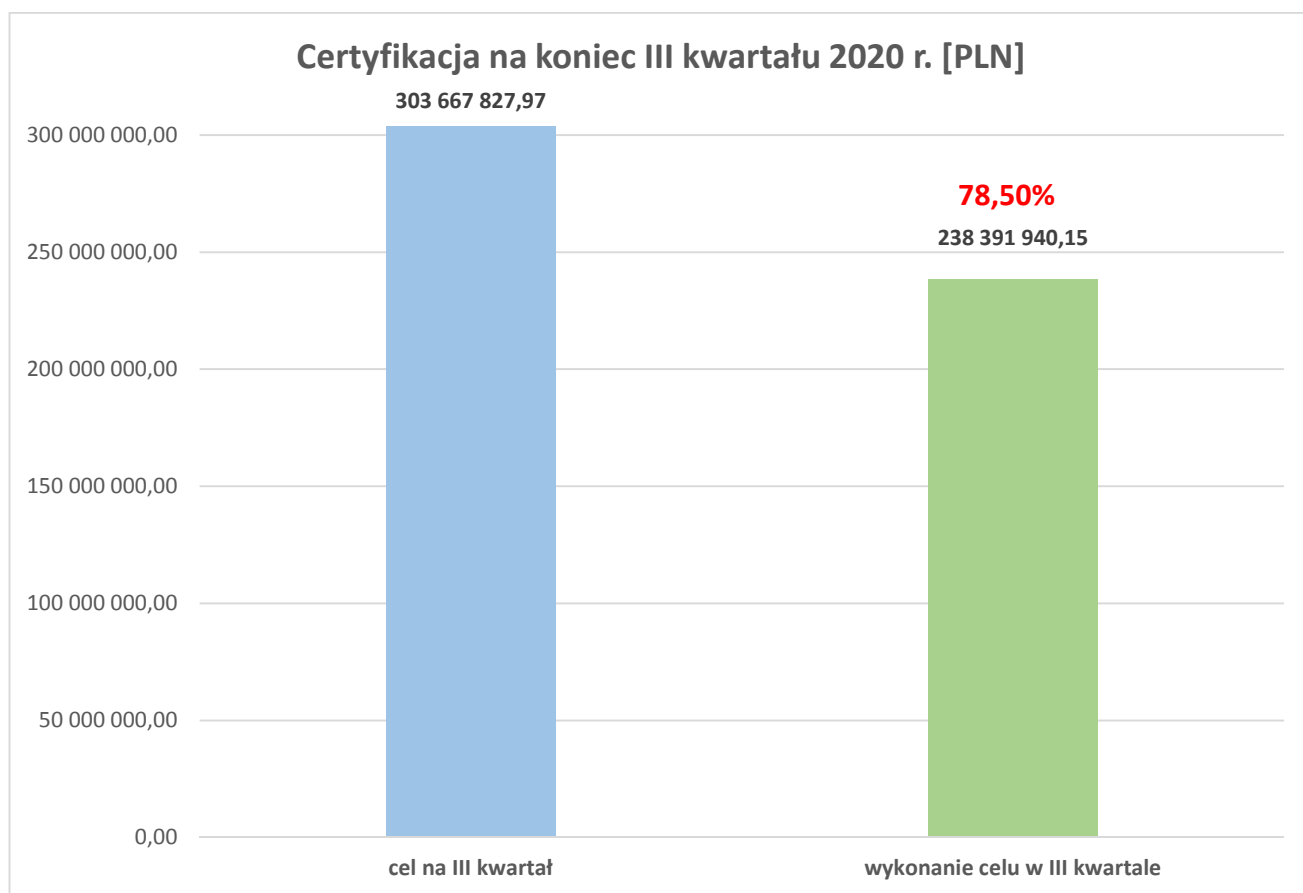

Zaplanowany cel certyfikacji Programu w III kwartale 2020 r. został osiągnięty na poziomie 78,50%, przy czym:

- dla EFRR na poziomie 83,07%,
- dla EFS na poziomie 69,17%.

Narastająco na koniec III kwartału 2020 r. poświadczono wydatki na poziomie 39,61% alokacji Programu wobec zaplanowanej wysokości 40,3%, zatem certyfikacja Programu nie została osiągnięta.

## I. WNIOSKI I REKOMENDACJE

### Zdiagnozowane problemy:

- Niski poziom certyfikacji IF. Mimo, że umowy z KPFR i BGK zostały podpisane w poł. 2017 roku dopiero w połowie 2019 rozliczone zostało 60% pierwszych transz;
- wydłużanie terminów naborów w ogłoszonych konkursach z uwagi na wnioski potencjalnych wnioskodawców, argumentowane niegotowością do złożenia wniosku;
- zmiana terminu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym w Poddziałaniu 6.1.1 – Przebudowa i rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu – etap II.
- wydłużanie procesu oceny projektów poza termin wynikający z procedur, z uwagi na wnioski Departamentu Wdrażania spowodowany m.in. prośbami wnioskodawców o wydłużenie terminu na uzupełnienie wniosku o dofinansowanie, powodujące opóźnienie kontraktacji;
- nieterminowe przygotowywanie przez beneficjentów niezbędnych załączników do umów, wnioski beneficjentów o wydłużenie terminów na złożenie dokumentów do umowy, prowadzące do znacznych opóźnień w podpisywaniu umów;
- niskie tempo wdrażania projektów własnych IZ przy dużej absorpcji środków z RPO;
- rozwiązywanie umów z inicjatywy IZ lub beneficjentów (z powodu pokrywania się zakresu rzeczowego projektów składanych w kolejnych konkursach, braku środków na realizację projektów, anulowania przetargów z powodu znacznego wzrostu wartości kontraktów po przetargu), powodujące spadek kontraktacji;
- odstępowanie od podpisania umowy pomimo wyboru projektu do dofinansowania;
- wydłużenie terminów na złożenie wniosków o płatność w związku z pandemią COVID-19;
- wydłużenie wszystkich procesów administracyjnych zarówno po stronie IZ, jak i beneficjentów w związku z pandemią COVID-19;

### Rekomendacje:

- nie wydłużanie terminów naborów w ogłoszonych konkursach;
- zwiększenie tempa wdrażania projektów własnych i przedkładania do IZ znaczących finansowo wnp;
- aktualizacja Planu działań na 2020 rok w zakresie Załącznika nr 11. *Środki alokacji RPO nierozdysponowane w harmonogramie na 2020 r.* z uwagi na realokację środków przeznaczonych na walkę z COVID-19;

Załączniki:

Załącznik nr 1 Podsumowanie celów kontraktacji i certyfikacji w podziale na kwartały i fundusze

Załącznik nr 2 Podsumowanie celów kontraktacji i certyfikacji

Przygotował:

Departament Funduszy Europejskich

Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
