




Załącznik do uchwały Nr 8/298/21
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskie
z dnia 3 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU DZIAŁAŃ NA 2020 ROK DLA RPO WK-P NA LATA 2014-2020

KONTRAKTACJA brutto (nie uwzględnia umów rozwiązanych w danym okresie, uwzględnia aneksy zwiększające dofinansowanie)

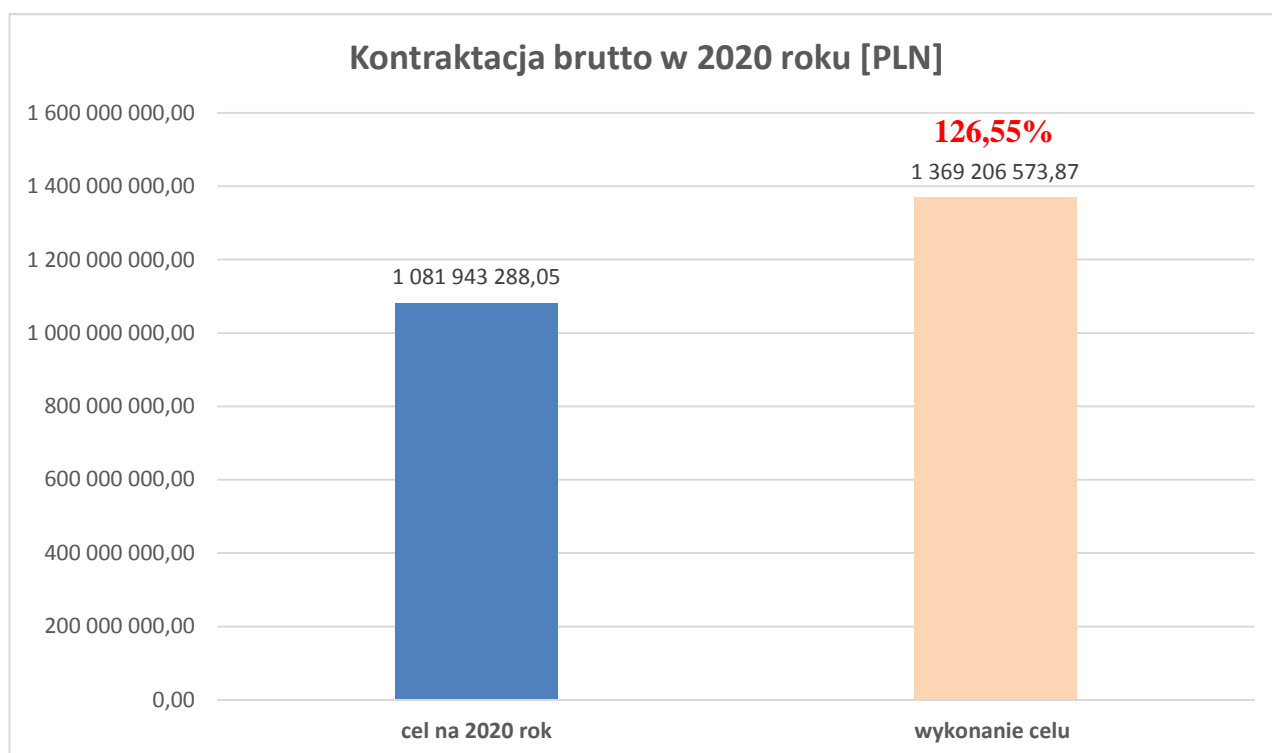


Plan działań na 2020 rok zakładał, że przyrost kontraktacji w 2020 r. wyniesie 13,35% alokacji Programu¹. W 2020 r. wartość umów podpisanych w ramach EFRR stanowiła kwotę 1 002 904 960,75 zł, co przełożyło się na realizację zaplanowanego celu w 134,66%, natomiast wartość umów podpisanych w ramach EFS stanowiła kwotę 366 301 613,12 zł, co przełożyło się na realizację zaplanowanego celu w 108,64%. Łącznie wartość umów podpisanych w 2020 r. wyniosła

¹ Na potrzeby Sprawozdania z realizacji Planu Działań na 2020 r. dla RPO WK-P na lata 2014-2020 dla obliczenia kontraktacji przyjęto wartość alokacji Programu przeliczoną po kursie 4,2567, tj. 8 102 799 939,67 zł.

1 369 206 573,87 zł, co stanowi 16,9% alokacji przyznanej na realizację Programu, tym samym planowany przyrost kontraktacji na poziomie 13,35% został zrealizowany.

Biorąc pod uwagę działania podjęte w 2020 r. (nie uwzględniając umów rozwiązanych, a uwzględniając aneksy zwiększające dofinansowanie w tym okresie) należy uznać, że cel kontraktacji (brutto) dla Programu na 2020 r. zrealizowany został w 126,55%.

KONTRAKTACJA netto (uwzględnia wszystkie zmiany związane z aneksowaniem i rozwiązywaniem umów)

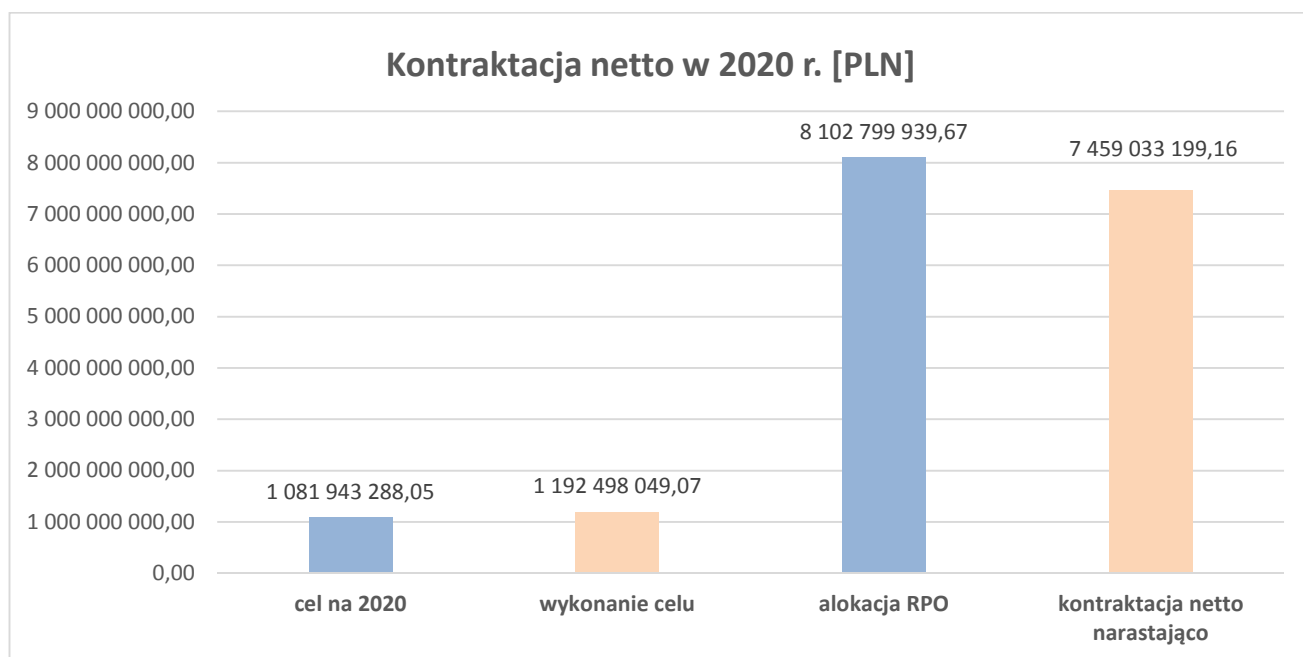

W Planie działań na 2020 rok przyjęto za cel kontraktacji osiągnięcie 89% alokacji Programu na koniec IV kwartału.

W 2020 r. rozwiązano 42 umowy o dofinansowanie projektów na łączną wartość środków UE 254 995 019,18 zł.

Biorąc pod uwagę fakt, że kontraktacja jest procesem zmieniającym się w czasie zarówno poprzez podpisywanie nowych umów o dofinansowanie projektu, ale także poprzez aneksowanie już zawartych umów (uwzględniające oszczędności powstałe na projektach lub uwzględniające podwyższenie poziomu dofinansowania), jak również ich rozwiązywanie, kontraktacja netto na koniec 2020 r. wyniosła 1 192 498 049,07 zł, co stanowi 110,22% realizacji założonego celu.


Od początku realizacji RPO WK-P 2014-2020 do 31.12.2020 r. podpisano 2 784 umowy na łączną wartość 7 459 033 199,16 zł, w tym 1 610 umów z EFRR na wartość 5 401 430 740,49 zł oraz 1 174

umowy z EFS na wartość 2 057 602 458,67 zł, co przekłada się na realizację zaplanowanego celu, narastająco na koniec 2020 r. w 92,06%.

Natomiast, uwzględniając alokację dla Programu przeliczoną po kursie bieżącym - na dzień 31.12.2020 r., tj. 8.673.481,317,72 zł - kontraktacja netto na koniec 2020 r. wyniosła 86% alokacji Programu.

Podsumowanie realizacji celu kontraktacji znajduje się w załączniku nr 2.

CERTYFIKACJA

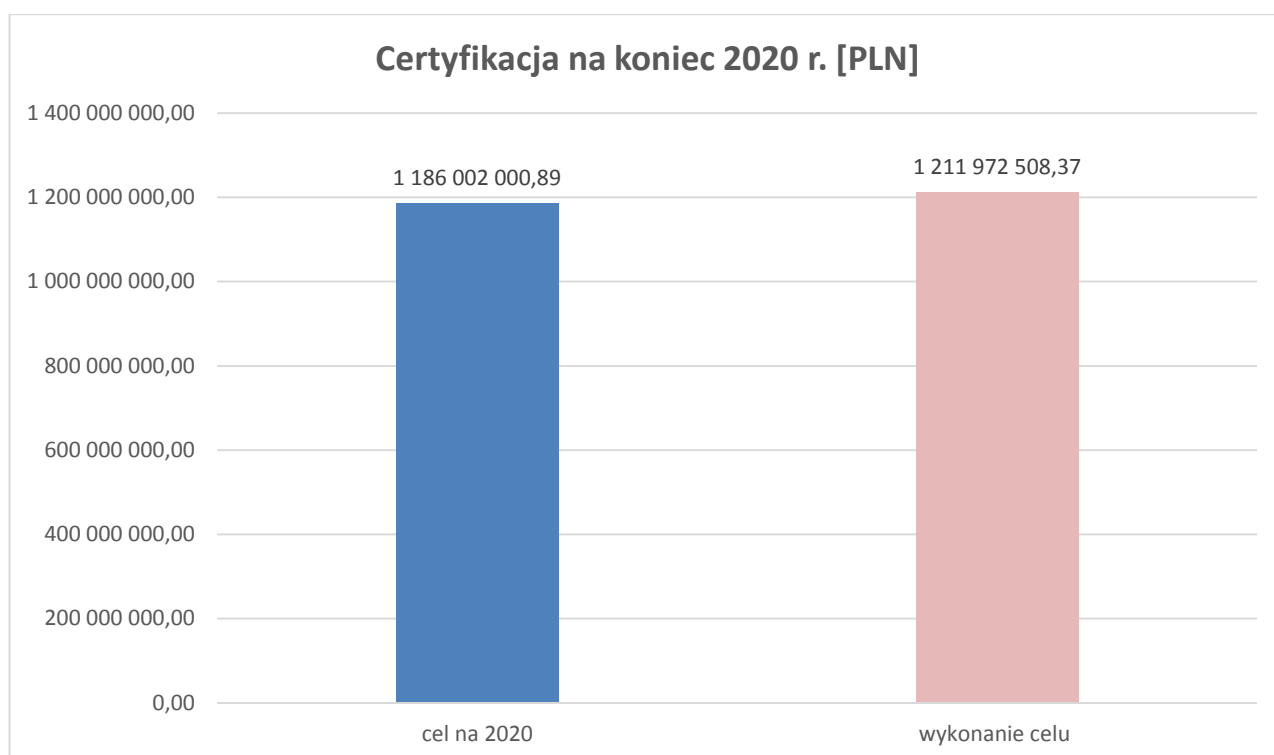

Zaplanowany cel certyfikacji Programu na 2020 r. został osiągnięty na poziomie 102,19%, przy czym:

- dla EFRR na poziomie 102,26%,
- dla EFS na poziomie 102,03%.

Narastająco na koniec 2020 r. certyfikacja Programu została osiągnięta w stopniu nieco wyższym niż planowany. Poświadczono wydatki na poziomie 46,27% alokacji Programu wobec zaplanowanej wysokości 46% alokacji Programu.

Tym samym została osiągnięta wartość zasady n+3 dla 2020 r., tj. 34,5% alokacji, co zgodnie z założeniami Planu działań było do osiągnięcia w II kwartale 2020 r.

Podsumowanie realizacji celu certyfikacji znajduje się w załączniku nr 2.

I. WNIOSKI I REKOMENDACJE

Zdiagnozowane problemy:

- Niski poziom certyfikacji IF. Mimo, że umowy z KPFR i BGK zostały podpisane w poł. 2017 roku dopiero w połowie 2019 rozliczone zostało 60% pierwszych transz;
- wydłużanie terminów naborów w ogłoszonych konkursach z uwagi na wnioski potencjalnych wnioskodawców, argumentowane niegotowością do złożenia wniosku;
- zmiana terminu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym w Poddziałaniu 6.1.1 – Przebudowa i rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. L. Rydygiera w Toruniu – etap II.
- wydłużanie procesu oceny projektów poza termin wynikający z procedur, z uwagi na wniosek Departamentu Wdrażania spowodowany m.in. prośbami wnioskodawców o wydłużenie terminu na uzupełnienie wniosku o dofinansowanie, powodujące opóźnienie kontraktacji;
- nieterminowe przygotowywanie przez beneficjentów niezbędnych załączników do umów, wnioski beneficjentów o wydłużenie terminów na złożenie dokumentów do umowy, prowadzące do znacznych opóźnień w podpisywaniu umów;
- niskie tempo wdrażania projektów własnych IZ przy dużej absorpcji środków z RPO;
- rozwiązywanie umów z inicjatywy IZ lub beneficjentów (z powodu pokrywania się zakresu rzeczowego projektów składanych w kolejnych konkursach, braku środków na realizację projektów, anulowania przetargów z powodu znacznego wzrostu wartości kontraktów po przetargu), powodujące spadek kontraktacji;
- odstępowanie od podpisania umowy pomimo wyboru projektu do dofinansowania;
- wydłużenie terminów na złożenie wniosków o płatność w związku z pandemią COVID-19;
- wydłużenie wszystkich procesów administracyjnych zarówno po stronie IZ, jak i beneficjentów w związku z pandemią COVID-19.

Rekomendacje:

- nie wydłużanie terminów naborów w ogłoszonych konkursach;
- zwiększenie tempa wdrażania projektów własnych i przedkładania do IZ znaczących finansowo wnp.

- Zastosowanie mechanizmu dającego możliwość czasowego zastosowania podwyższonego poziomu dofinansowania UE do 100 % we wnioskach o płatność certyfikowanych do KE w roku obrachunkowym 2020/2021 dla RPO WK-P na lata 2014-2020 r. Wyższy poziom refundowanych z KE środków w okresie 01.07.2020 r. – 30.06.2021 r. wynikający z czasowego podniesienia do 100% certyfikacji wydatków kwalifikowalnych daje potencjalny czasowy uzysk w poziomie zrefundowanych środków o 2,63% alokacji dla Programu.
- Zapewnienie, tam gdzie to możliwe, finansowanie projektom znajdującym się na listach rezerwowych (np. poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych; działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych).

Załączniki:

Załącznik nr 1 Podsumowanie celów kontraktacji i certyfikacji w podziale na kwartały i fundusze.

Załącznik nr 2 Podsumowanie celów kontraktacji i certyfikacji.

Przygotował:

Departament Funduszy Europejskich

Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
