




Załącznik do uchwały Nr 8/299/21  
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskie  
z dnia 3 marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU DZIAŁAŃ NA 2020 ROK  
DLA RPO WK-P NA LATA 2014-2020  
za IV kwartał 2020 r.**

**KONTRAKTACJA brutto** (nie uwzględnia umów rozwiązanych w danym okresie, uwzględnia aneksy zwiększające dofinansowanie)

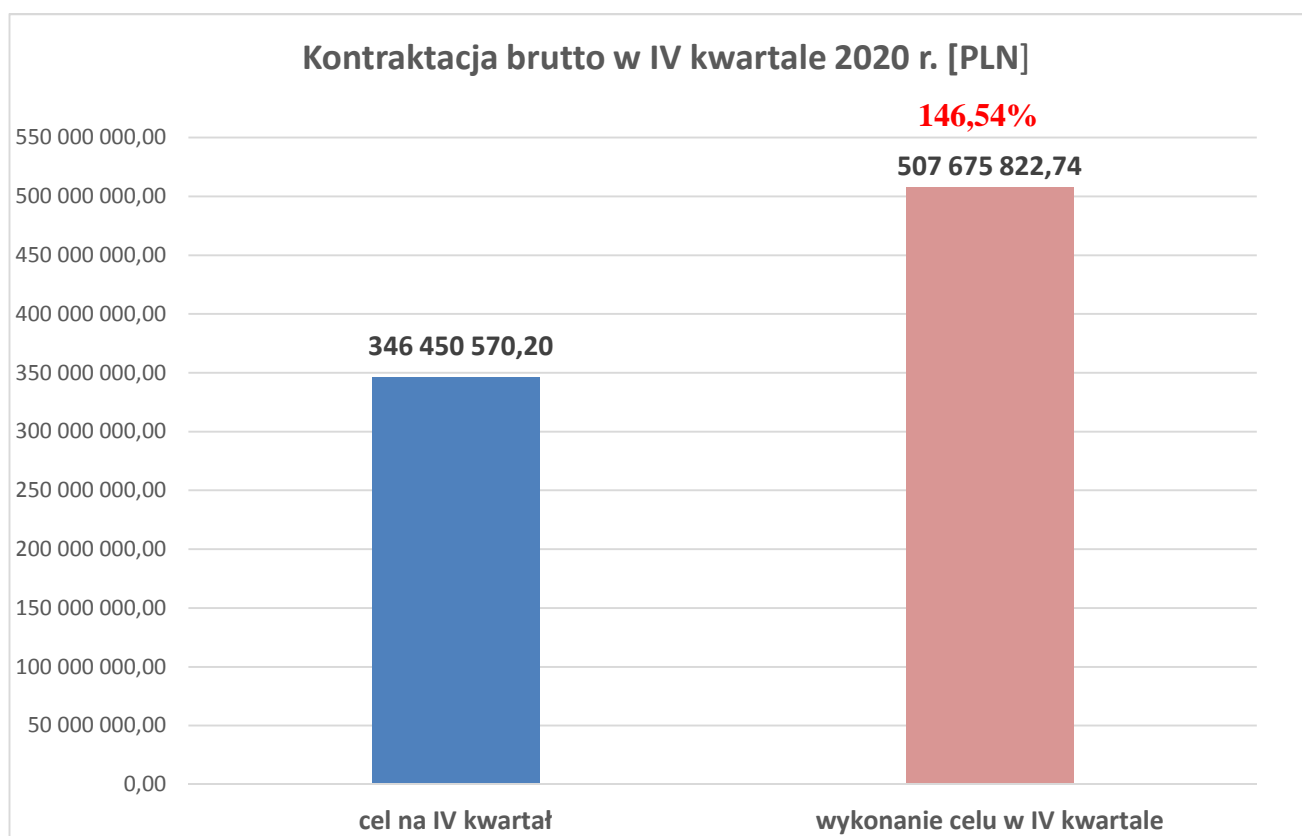


Plan działań na 2020 rok zakłada, że przyrost kontraktacji w IV kwartale 2020 r. wyniesie 4,28% alokacji Programu<sup>1</sup>, co przełoży się na osiągnięcie na koniec IV kwartału kontraktacji na poziomie 89,37%.

<sup>1</sup> Na potrzeby Sprawozdania z realizacji Planu Działań na 2020 r. dla RPO WK-P na lata 2014-2020 dla obliczenia kontraktacji przyjęto wartość alokacji Programu przeliczoną po kursie 4,2567, tj. 8 102 799 939,67 zł.

Biorąc pod uwagę działania podjęte w IV kwartale (nie uwzględniając umów rozwiązanych, a uwzględniając aneksy zwiększające dofinansowanie w tym okresie) należy uznać, że cel kontraktacji (brutto) dla Programu na IV kwartał 2020 r. zrealizowany został w 146,54%.

Wartość umów podpisanych w ramach EFRR stanowiła kwotę 336 638 147,73 zł, co przełożyło się na realizację zaplanowanego celu w 140,12%, natomiast wartość umów podpisanych w ramach EFS stanowiła kwotę 171 037 675,01 zł, co przełożyło się na realizację zaplanowanego celu w 161,04%. Wartość umów podpisanych w IV kwartale (łącznie 507 675 822,74 zł) stanowi 6,27% alokacji przyznanej na realizację Programu, zatem planowany przyrost kontraktacji na poziomie 4,28% został zrealizowany.

**KONTRAKTACJA netto** (uwzględnia wszystkie zmiany związane z aneksowaniem i rozwiązywaniem umów)

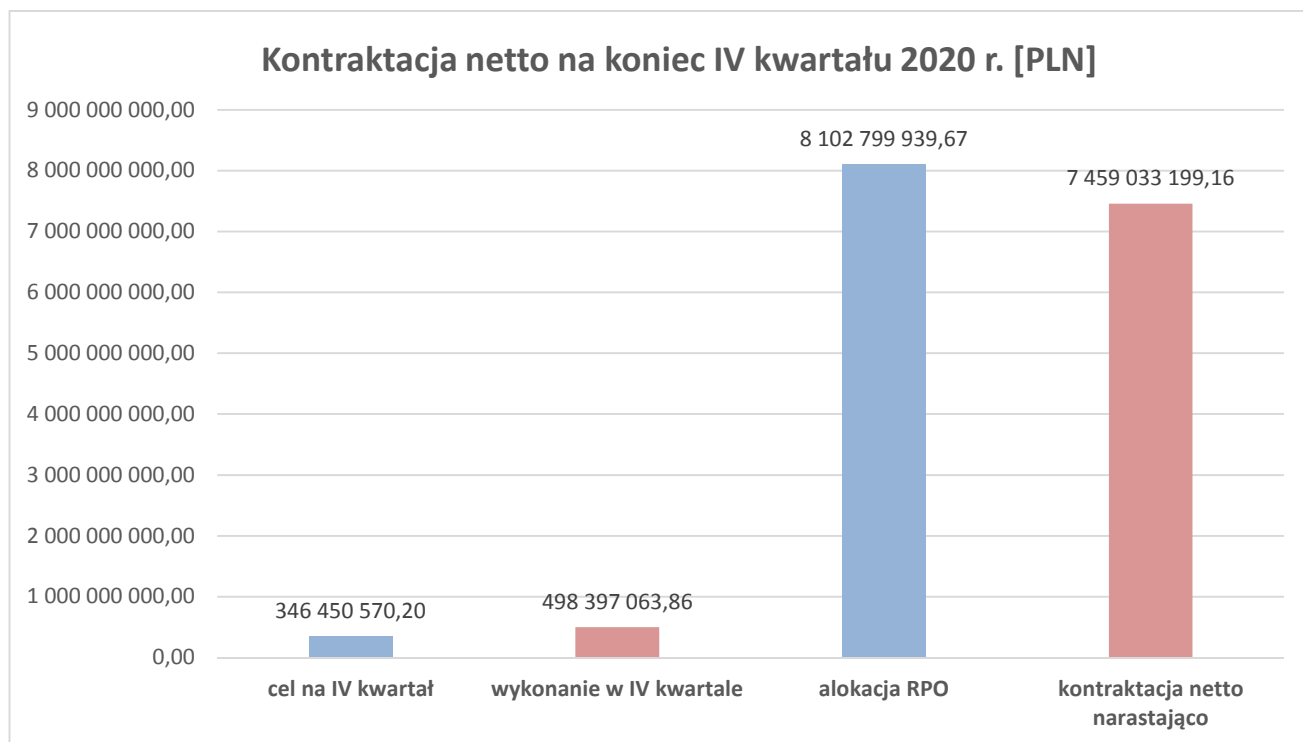

W Planie działań na 2020 rok przyjęto za cel kontraktacji osiągnięcie 89% alokacji Programu na koniec IV kwartału.


W 2020 r. anulowano/rozwiązano 42 umowy na wartość środków UE 254 995 019,18 zł. W związku z aneksowaniem umów, uwzględniając zarówno aneksy zwiększające, jak i zmniejszające wartość umów podpisanych w ramach EFRR zwiększyła się o 8 895 561,45 zł, natomiast wartość umów

podpisanych w ramach EFS zwiększyła się o 51 728 637,31 zł. Ostatecznie, kontraktacja netto w IV kwartale wyniosła 498 397 063,86 zł.

Biorąc pod uwagę fakt, że kontraktacja jest procesem zmieniającym się w czasie zarówno poprzez podpisywanie nowych umów o dofinansowanie projektu, ale także poprzez aneksowanie już zawartych umów (uwzględniające oszczędności powstałe na projektach lub uwzględniające podwyższenie poziomu dofinansowania), jak również ich rozwiązywanie, kontraktacja netto (narastająco) na koniec IV kwartału 2020 r. wyniosła 7 459 033 199,16 zł, co stanowi 92,06% alokacji.

Natomiast, uwzględniając alokację dla Programu przeliczoną po kursie bieżącym - na dzień 31.12.2020 r., tj. 8.673.481,317,72 zł - kontraktacja netto na koniec 2020 r. wyniosła 86% alokacji Programu.

## CERTYFIKACJA

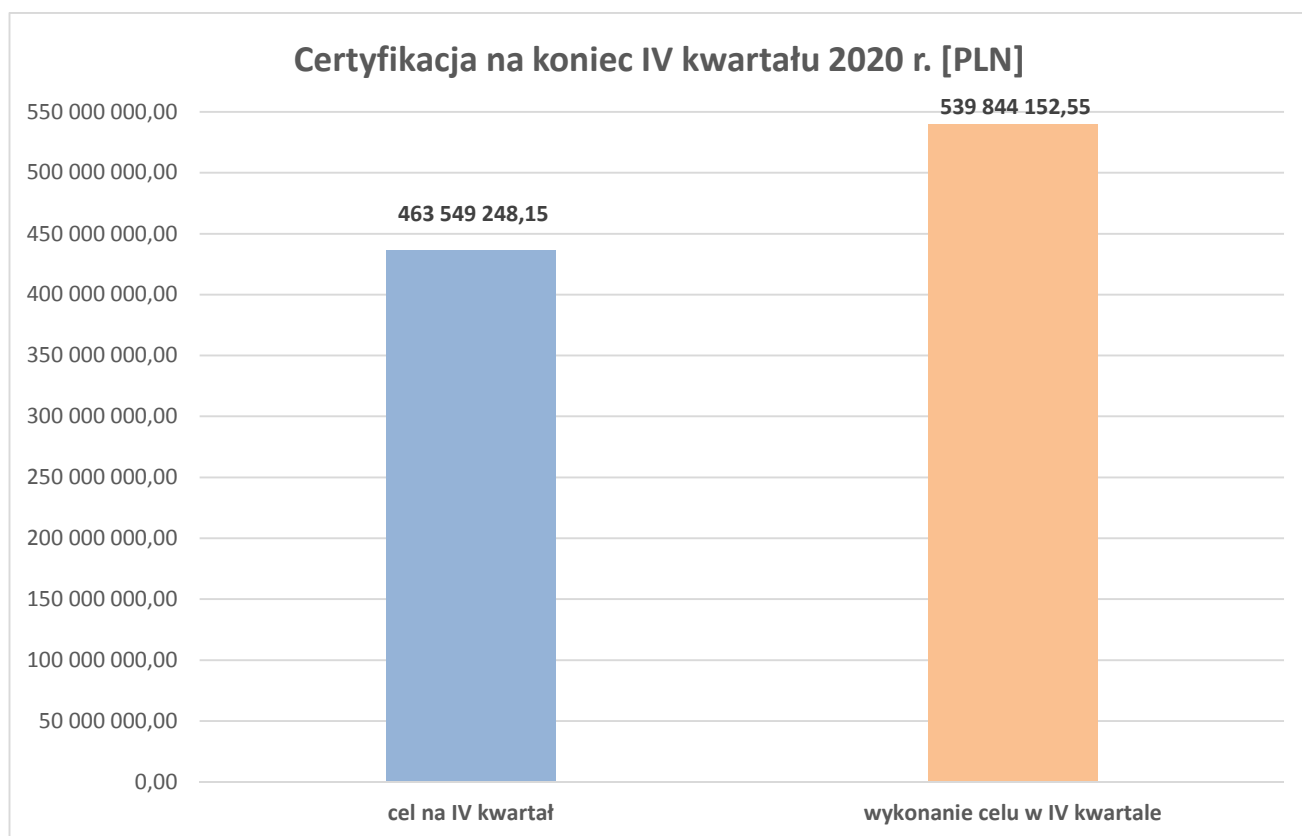

Zaplanowany cel certyfikacji Programu w IV kwartale 2020 r. został osiągnięty na poziomie 116,46%, przy czym:

- dla EFRR na poziomie 98,86%,
- dla EFS na poziomie 177,85%.

Narastająco na koniec IV kwartału 2020 r. poświadczono wydatki na poziomie 46,27% alokacji Programu wobec zaplanowanej wysokości 46%, zatem certyfikacja Programu została osiągnięta.

## I. WNIOSKI I REKOMENDACJE

### Zdiagnozowane problemy:

- Niski poziom certyfikacji IF. Mimo, że umowy z KPFR i BGK zostały podpisane w poł. 2017 roku dopiero w połowie 2019 rozliczone zostało 60% pierwszych transz;
- wydłużanie terminów naborów w ogłoszonych konkursach z uwagi na wnioski potencjalnych wnioskodawców, argumentowane niegotowością do złożenia wniosku;
- zmiana terminu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym w Poddziałaniu 6.1.1 – Przebudowa i rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. L. Rydygiera w Toruniu – etap II.
- wydłużanie procesu oceny projektów poza termin wynikający z procedur, z uwagi na wnioski Departamentu Wdrażania spowodowany m.in. prośbami wnioskodawców o wydłużenie terminu na uzupełnienie wniosku o dofinansowanie, powodujące opóźnienie kontraktacji;
- nieterminowe przygotowywanie przez beneficjentów niezbędnych załączników do umów, wnioski beneficjentów o wydłużenie terminów na złożenie dokumentów do umowy, prowadzące do znacznych opóźnień w podpisywaniu umów;
- niskie tempo wdrażania projektów własnych IZ przy dużej absorpcji środków z RPO;
- rozwiązywanie umów z inicjatywy IZ lub beneficjentów (z powodu pokrywania się zakresu rzeczowego projektów składanych w kolejnych konkursach, braku środków na realizację projektów, anulowania przetargów z powodu znacznego wzrostu wartości kontraktów po przetargu), powodujące spadek kontraktacji;
- odstępowanie od podpisania umowy pomimo wyboru projektu do dofinansowania;
- wydłużenie terminów na złożenie wniosków o płatność w związku z pandemią COVID-19;
- wydłużenie wszystkich procesów administracyjnych zarówno po stronie IZ, jak i beneficjentów w związku z pandemią COVID-19.

### Rekomendacje:

- nie wydłużanie terminów naborów w ogłoszonych konkursach;

- zwiększenie tempa wdrażania projektów własnych i przedkładania do IZ znaczących finansowo wnp.

Załączniki:

Załącznik nr 1 Podsumowanie celów kontraktacji i certyfikacji w podziale na kwartały i fundusze

Załącznik nr 2 Podsumowanie celów kontraktacji i certyfikacji

Przygotował:

Departament Funduszy Europejskich

Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
