


**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU DZIAŁAŃ NA 2022 ROK**  
**DLA RPO WK-P NA LATA 2014-2020**  
**za III kwartał 2022 r.**

**KONTRAKTACJA brutto** (nie uwzględnia umów rozwiązanych w danym okresie, uwzględnia aneksy zwiększające dofinansowanie).

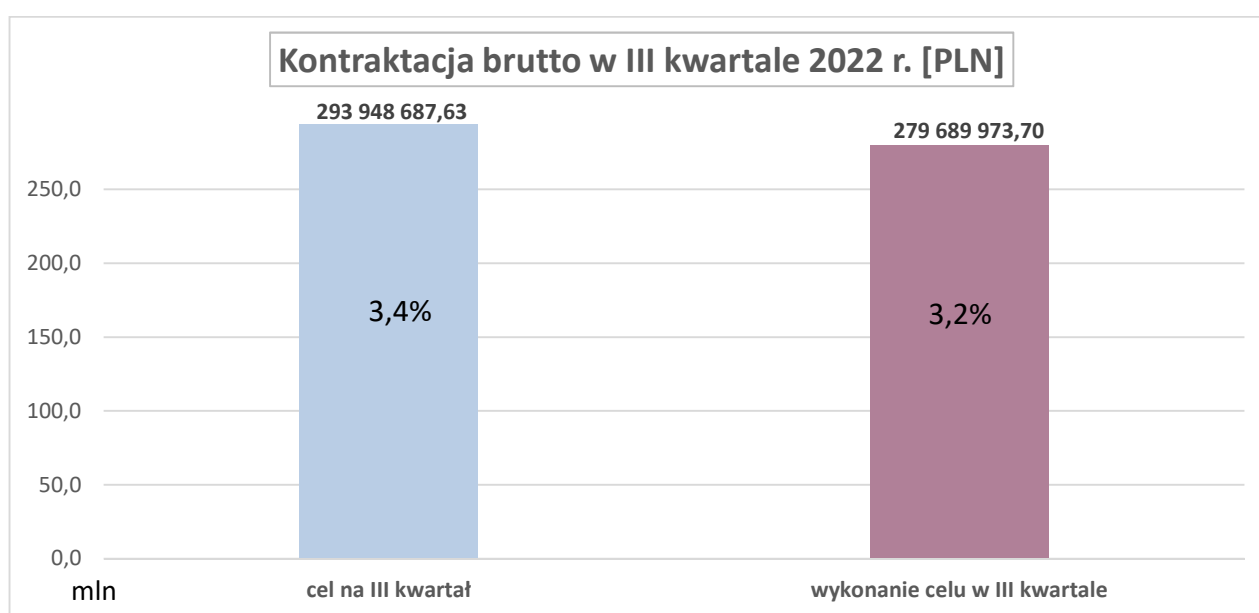

Plan działań na 2022 rok zakłada, że przyrost kontraktacji brutto w III kwartale 2022 r. wyniesie łącznie 3,4% alokacji Programu<sup>1</sup>, co przełoży się na osiągnięcie na koniec III kwartału kontraktacji brutto<sup>2</sup> na poziomie 101,2%. Biorąc pod uwagę działania podjęte w III kwartale (nie uwzględniając umów rozwiązanych, a uwzględniając aneksy zwiększające dofinansowanie w tym okresie) należy uznać, że cel kontraktacji (brutto) dla Programu na III kwartał 2022 r. zrealizowany został w 95,2%.


Wartość kontraktacji w ramach EFRR stanowiła kwotę 252.355.665,39 zł, co przełożyło się na realizację zaplanowanego celu w 120,3%, natomiast wartość kontraktacji w ramach EFS stanowiła kwotę 27.334.308,31 zł, co przełożyło się na realizację zaplanowanego celu w 32,5%. Wartość kontraktacji brutto w III kwartale (łącznie 279.689.973,70 zł) stanowi 3,2% alokacji przyznanej na

<sup>1</sup> Na potrzeby Sprawozdania z realizacji Planu Działań na 2022 r. dla RPO WK-P na lata 2014-2020 za II kwartał 2022 r. dla obliczenia kontraktacji brutto przyjęto wartość alokacji Programu przeliczoną wg algorytmu z arkusza wyznaczającego limity na dzień 05.01.2022 tj. 8 526 747 309 zł. Dodatkowo po aktualizacji zapisów KT uwzględniono transzę I REACT EU w wysokości 101 957 163 zł (łącznie **8.628 704 472 zł**)

<sup>2</sup> Kontraktacja brutto liczona jest na koniec okresu jako kontraktacja netto z końca 2021 r. po przyrostach brutto w kolejnych okresach.

realizację Programu, zatem planowany przyrost kontraktacji na poziomie 3,4% został prawie zrealizowany.

**KONTRAKTACJA netto** (uwzględnia wszystkie zmiany związane z aneksowaniem i rozwiązywaniem umów).

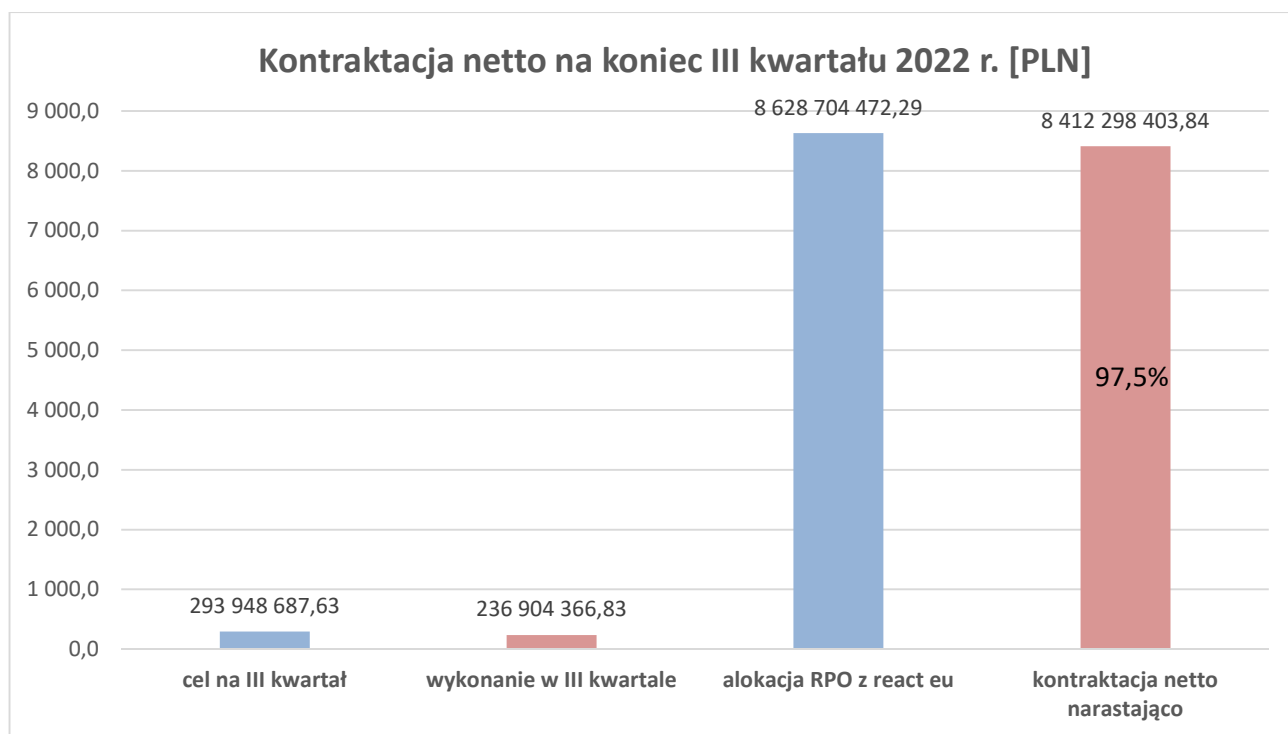

W Planie działań na 2022 rok przyjęto za cel kontraktacji osiągnięcie 100%<sup>3</sup> alokacji Programu na koniec III kwartału.

W III kwartale 2022 r. anulowano/rozwiązano 9 umów na wartość środków UE 21.283.001,47 zł (8 umów w ramach EFRR na kwotę dofinansowania UE 20.473.032,65 zł i 1 umowa w ramach EFS na kwotę dofinansowania UE 809.968,82 zł). W związku z aneksowaniem umów, uwzględniając zarówno aneksy zwiększające, jak i zmniejszające, wartość umów aneksowanych w ramach EFRR zmniejszyła się o 433.356,86 zł, natomiast wartość umów aneksowanych w ramach EFS zwiększyła się o 17.077.407,54 zł. Ostatecznie, kontraktacja netto w III kwartale wyniosła 236.904.366,83 zł.

Biorąc pod uwagę fakt, że kontraktacja jest procesem zmieniającym się w czasie zarówno poprzez podpisywanie nowych umów o dofinansowanie projektu, ale także poprzez aneksowanie już zawartych umów (uwzględniające oszczędności powstałe na projektach lub uwzględniające

<sup>3</sup> Kontraktacja netto może osiągnąć maksymalnie poziom alokacji tj. 100% alokacji.

podwyższenie poziomu dofinansowania), jak również ich rozwiązywanie, kontraktacja netto (narastająco) na koniec III kwartału 2022 r. wyniosła 8.412.298.403,84 zł, co stanowi 97,5% alokacji.


Poniżej syntetyczne przedstawienie przyczyn braku osiągnięcia kontraktacji brutto na poziomie 101,2% alokacji Programu na koniec III kwartału:

1. w części EFS:

- planowana wysokość zakontraktowania środków EFS w ramach Pomocy Technicznej nie została osiągnięta ze względu na zmiany założeń odnośnie ich wykorzystania z przeznaczeniem na remont siedziby Urzędu Marszałkowskiego,

- zmiany kursu euro i związane z tym braki dostępności środków w limitach kontraktacji na dany miesiąc, co wiązało się z koniecznością dokonywania przesunięć w procesie podpisywania/aneksowania umów o dofinansowanie.

## CERTYFIKACJA

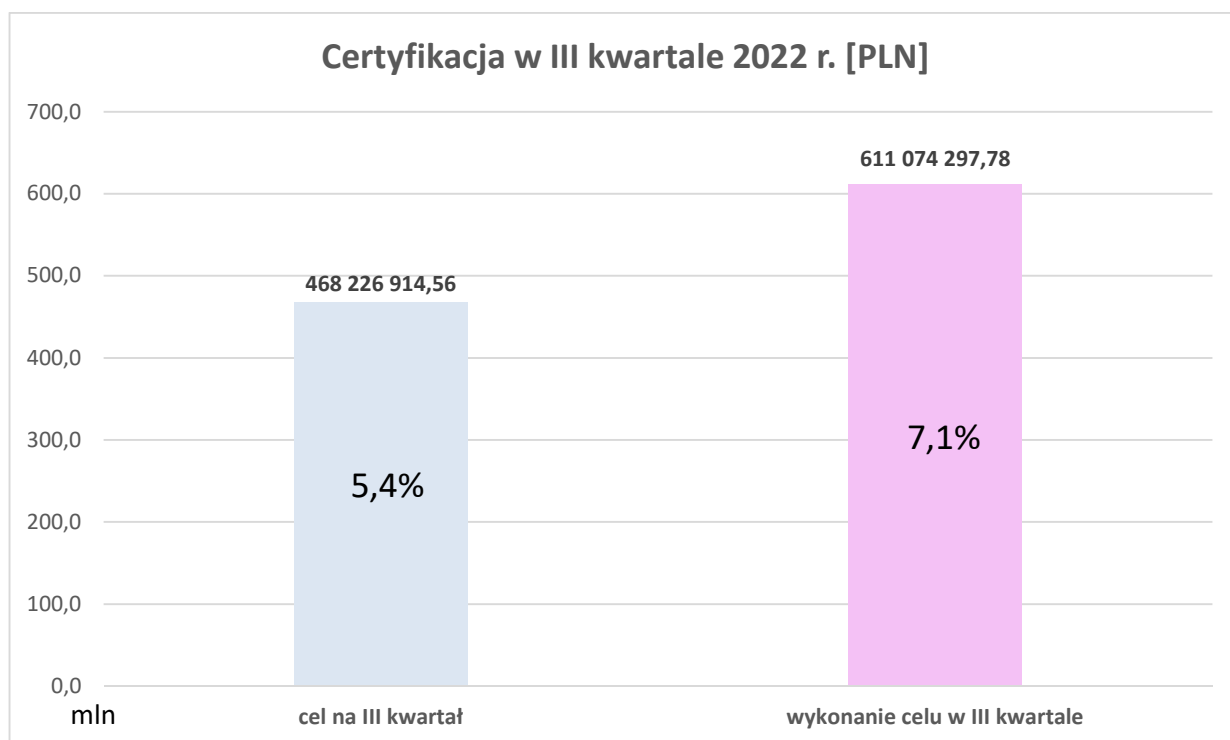

Certyfikacja Programu w III kwartale 2022 r. wyniosła 611.074.297,78 zł (kwota wnioskowana), w związku z czym cel certyfikacji na III kwartał 2022 r. został osiągnięty na poziomie 130,5%, przy czym:

- wartość zacertyfikowanych (wnioskowanych) środków EFRR wyniosła 455.401.843,50 zł, co stanowi 127,9%, celu wyznaczonego na III kwartał 2022r.;

- wartość zacertyfikowanych (wnioskowanych) środków EFS wyniosła 155.672.454,28 zł, co stanowi 138,8% celu wyznaczonego na III kwartał 2022r.

Narastająco na koniec III kwartału 2022 r. poświadczono wydatki w wysokości 6.924.925.209,02 zł (kwota wnioskowana), co stanowi 80,3% alokacji Programu przyjętej do planu działań, natomiast licząc w EUR poświadczono środki na poziomie 80,4%, wobec zaplanowanej wysokości 79,5%, zatem certyfikacja Programu została osiągnięta.

## I. WNIOSKI I REKOMENDACJE

### Zdiagnozowane problemy:

- niskie tempo wdrażania projektów własnych przy dużym zaangażowaniu środków z RPO – dotyczy projektów w ramach osi priorytetowej 2 oraz 5;
- rozwiązywanie umów z inicjatywy IZ RPO lub beneficjentów (brak środków na realizację projektów, unieważnianie przetargów z powodu znacznego wzrostu wartości kontraktów po przetargu), powodujące spadek kontraktacji;
- odstępowanie przez wnioskodawców od zawarcia umowy pomimo wyboru projektu do dofinansowania;
- wydłużanie terminów na korektę wniosków o płatność z przyczyn leżących po stronie beneficjenta (dotyczy szczególnie projektów własnych);
- trudności w realizacji procesów administracyjnych po stronie wnioskodawcy/beneficjenta;

### Rekomendacje:

- zwiększenie tempa wdrażania projektów własnych - dotyczy projektów w ramach osi priorytetowej 2 oraz 5 poprzez wyznaczanie kamieni milowych na rozliczanie wydatków w danym kwartale/roku;
- zapewnienie, tam gdzie to możliwe, finansowania projektom znajdującym się na listach rezerwowych lub z niepełnym w świetle kryteriów wyboru projektów poziomem dofinansowania.

Załączniki:

Załącznik nr 1 Podsumowanie celów kontraktacji i certyfikacji w podziale na kwartały i fundusze

Załącznik nr 2 Podsumowanie celów kontraktacji i certyfikacji

Załącznik nr 3 Monitorowanie planu dla osiągnięcia prognozy certyfikacji dla RPO WK-P na lata 2014-2020 – podsumowanie za II kwartał 2022 r.

Przygotował:

Departament Funduszy Europejskich

Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
